



Schutterspark

Brunssum

UITVOERINGSPROGRAMMA 2025-2030
OKTOBER 2025

gemeente **Brunssum**

bureau **VERBEEK**
landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp





UITVOERINGSPROGRAMMA

In dit uitvoeringsprogramma voor het Schutterspark wordt beschreven welke concrete acties er in de periode 2025-2030 worden uitgevoerd, om daarmee invulling te geven aan de eerder vastgestelde ontwerpvisie. Een overzicht van de kosten en de prioritering van de verschillende maatregelen die op stapel staan, vormt de kern van dit document. De uitvoering van de eerste projecten heeft reeds plaatsgevonden of is in voorbereidende fase, zoals de reconstructie van de trap op de Kleiberg en de Schutterspromenade, de aanleg van nieuwe routepalen en bewegwijzering, het opknappen van vlonderpaden of het uitbreiden van de oppervlakte van hangvennen.

De ontwerpvisie die in 2022 is vastgesteld heeft als doel om richting te geven aan herstel en ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit en samenhang in het Schutterspark en draagt daarnaast bij aan de instandhouding van het gedachtegoed waarmee het park in het verleden is aangelegd en ontwikkeld: het Schutterspark in de gemeente Brunssum betreft een openbaar parkgebied met een bijzondere historie. Om dit te bereiken is uit de ontwerpvisie een lijst met maatregelen voortgekomen, waarin concreet wordt beschreven wat de maatregelen inhouden en op welke plek in het park ze uitgevoerd worden. Daarnaast zijn ook door verschillende gebruikers enkele wensen aangedragen om het te vernieuwen Schutterspark verder invulling te geven. Alle voorgaande wensen en toekomstige projecten zijn geïntegreerd in een lijst van 25 maatregelen. Een onderverdeling is hierin gemaakt tussen

maatregelen in uitvoering, concrete projecten voor de komende jaren en wensen die in de verre toekomst wellicht gerealiseerd kunnen worden.

Kaders

Aan dit uitvoeringsprogramma ligt het visiedocument Schutterspark ten grondslag, vastgesteld op 25 januari 2022. Het belang van dat document is onderstreept door het coalitieakkoord, waar het mogelijk maken van de museale functie van het Schutterspark door het realiseren van een museum in het pompegebouw Schutterspark en het met prioriteit uitvoeren van de vastgestelde visie zijn opgenomen. Het openbaar toegankelijk houden van een aantrekkelijk Schutterspark vormt hierin de kern. Diversiteit in geboden activiteiten op het gebied van natuurbeleving, passieve en actieve ontspanning en horeca dienen met respect voor



natuur- en landschapswaarden verder ontwikkeld te worden. Hierbij is de samenwerking met plaatselijke ondernemers cruciaal om tot een gedragen plan te komen.

In de vastgestelde begroting zijn de in het coalitieakkoord benoemde doelen beschreven en zijn de financiële middelen voor de eerste fase van de Schutterspromenade voor 2024 vrijgemaakt.

Daarnaast heeft IBA Parkstad een bedrag ter waarde van € 70.000,- beschikbaar gesteld om de noodzakelijke kwaliteit van de Schutterpromenade te behalen.

Uitvoeringsprogramma

In tabel 1 op pagina 7 is het uitvoeringsprogramma weergegeven voor de realisatie van de ontwerpvisie. De bijbehorende maatregelen zijn geprojecteerd op de kaart links. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën: projecten die al zijn uitgevoerd of in 2025 worden uitgevoerd, maatregelen die in de komende jaren gepland staan en maatregelen die op langere termijn als wensbeeld zijn opgenomen.

De prioritering van de maatregelen die tussen 2025 en 2033 gefaseerd worden uitgevoerd, is opgenomen in de tabel en terug te vinden in de lijst in bijlage 1. Hierbij is rekening gehouden met zowel het uitvoeringsproces als het planproces. De geschatte kosten vormden daarbij een belangrijk uitgangspunt. Deze kosten zijn opgebouwd uit drie elementen: uitvoeringskosten, planvormingskosten, apparaatkosten, resulterend in de totale projectkosten.

Uitvoeringskosten betreffen de daadwerkelijke aanleg. Planvormingskosten hebben betrekking op het opstellen van ontwerpen en het doorlopen van procedures zoals vergunningen. Apparaatkosten omvatten gemeentelijke uitgaven, bijvoorbeeld voor de inhuur van een projectleider.

Een aantal maatregelen is 'laaghangend fruit': relatief eenvoudige projecten die binnen afzienbare tijd uitgevoerd kunnen worden. Deze zijn doorgaans minder kostbaar dan grotere infrastructurele projecten, zoals de herinrichting van parkeerplaatsen of de aanleg van een bijzonder middelpunt aan het einde van de Schutterspromenade.

Het uitvoeren van het beeldkwaliteitplan is niet alleen onderdeel van het ontwerpproces van de afzonderlijke maatregelen, maar draagt ook bij

aan de opwaardering van het gehele park. Dit speelt een rol in de periode 2025–2030, maar blijft ook daarna richtinggevend bij toekomstige ontwikkelingen. Denk hierbij aan het plaatsen van nieuwe zitgelegenheden, verlichting en andere inrichtingselementen. De Schutterspromenade vormt het referentiebeeld voor de beoogde kwaliteit.

Eind 2026 wordt een evaluatie- of actualisatiemoment gepland om de voortgang te bespreken en te waarborgen dat de doelstellingen binnen de gestelde termijnen worden behaald. Dit moment is bedoeld voor de gemeente Brunssum en voor overleg met ondernemers en gebruikers. Particuliere ondernemers die momenteel actief zijn in het Schutterspark zullen samenwerken in een nieuw op te richten stichting. Deze samenwerking moet de continuïteit van het uitvoeringsprogramma waarborgen voor de ondernemingen die hierbij betrokken zijn.



Maatregelen

1. Realisatie Schutterspromenade tussen het Schuttershüske en het centrale cluster met de voorzieningen rondom de roeivijver. Daarmee wordt de belangrijkste recreatieve structuur uit de ontwerpen van Van Nes en Bergmans hersteld en definitief uitgebouwd tot de centrale verbindende as van het Volkspark.
2. Herinrichten terras en trappartij Schuttershüske op het kruispunt tussen de promenade en de landweer, zodat het centrale entreeplein van het Schutterspark haar allure terugkrijgt.
3. Samen met ondernemers komen tot een beeldkwaliteitsplan (o.a voor uniforme materialisatie/ terreinafscheiding).
4. Renoveren trap Kleiberg, zodat het cluster van recreatieve voorzieningen op de Kleiberg weer op directe wijze verbonden wordt met de recreatieve voorzieningen rondom de roeivijver. Bovenop de Kleiberg wordt de trap op representatieve wijze geïntegreerd in de routing en padenstructuur en verbonden met de entree.
5. Vernieuwen bebording: wegwijzers, routepalen etc. hierbij inbegrepen ook een duidelijke scheiding tussen wandel-/fietspaden. Om te voorkomen dat gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan, deze verkeersstromen van elkaar scheiden. Dit doormiddel van aanbrengen markeringen op de paden.
6. Opknappen vlonderpaden noordelijk deel Schutterspark, zodat ze weer een aantal jaren meekunnen.
7. Uitbreiden oppervlakte hangvennen door in te grijpen in de opstand Amerikaanse eiken en naaldhout, zodat populaties bijzondere flora en fauna zich kunnen uitbreiden en hier voor deze soorten ook een robuuste stapsteen kan ontstaan tussen de Brunsummerheide en de Schinveldse bossen.
8. Natuurspeelplaats aanleggen aan de voet van de trap aan de Kleiberg.
9. Opwaarderen vijverranden. Afkalvende oevers doordat de oeverbeschoeiing kwalitatief niet meer toereikend is tegengaan.
10. Aanplant bomenlaan langs pad in verlengde Schutterspromenade, naast kinderboerderij. De nieuwe aanplant zorgt dat alhier een duidelijke hiërarchie in de padenstructuur ontstaat en het bomendak weer gesloten wordt.
11. Vernieuwen bestaande verlichting in het park en aanbrengen verlichting in verlengde van Van Galenstraat. Dit is vergunningsvrij mogelijk i.r.t. NNN-gebied.
12. Revitaliseren asfaltverharding paden in het park. Langs kinderboerderij eveneens vervangen verlichting conform BKP en nieuwe aanplant bomen (zie ook maatregel 10).
13. Verbijzonderen hoofdentree nabij parkeerplaats aan de roeivijver (P2) volgens architectonische verschijningsvorm van entree bij Schuttershüske, waardoor het park representatieve entrees heeft.
14. Zitvoorzieningen in het park aanbrengen die niet alleen comfortabele rustgelegenheden vormen, maar ook hufferproof zijn.
15. Herinrichten parkeerplaats Schuttershüske (P1) tot een representatief geheel met een duidelijke routing en parkeerstructuur.
16. Herinrichten parkeerplaats roeivijver (P2) tot een representatief geheel met een duidelijke routing en parkeerstructuur.
17. Vervangen kunstwerk bij parkeerplaats aan de roeivijver (P2).
18. Opwaarderen Libellenpad (voorheen Parelpad).
19. Realisatie hondenspeelweide, locatie nader te onderzoeken.
20. Inzaaien bloemen(pluk)veld.
21. Verplaatsen parkeerplaats Kleiberg (P3) naar de overzijde van de Ganzepool en zorg dragen voor een representatieve inrichting passend bij het Schutterspark.
22. Verbijzonderen hoofdentree nabij parkeerplaats op de Kleiberg (P3).
23. Scheiding wandel- en fietspaden, om de verkeersveiligheid van de verschillende weggebruikers te verbeteren.
24. Inrichten bijzonder middelpunt van het Schutterspark aan de roeivijver, inclusief brug over de Rode beek. Het idee is dat hier een centraal trefpunt ontstaat van waaruit alle recreatieve voorzieningen op overzichtelijke wijze bereikbaar zijn. De ontwikkeling sluit aan op maatregel 1.
25. Conserveren waterwinputten, uitvoeren beheer in zichtlijn waterleiding en toevoegen puttenveld en pomphuizen met inbegrip van thema waterwinning aan beschermd dorpsgezicht.
26. Herstellen zichtlijn via de trap op de Kleiberg over het terrein van de mini-haven tot op de kinderboerderij aan de overzijde van de voormalige roeivijver.

		Totale projectkosten ¹	Jaar/jaren waarin accent van uitvoering ligt:						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Uitvoeringsprojecten	1. Schutterspromenade	Gereed	●						
	2a. Herinrichting terras Schuttershüske	Gereed	●						
	2b. Vervangen trappartij aan voorplein Schuttershüske	€ 48.750,-					●		
	3. Opstellen beeldkwaliteitplan	Gereed	●						
	4. Renoveren trap / trap integreren in de routing	Gereed	●						
	5. Vernieuwen bebording en bewegwijzering	€ 125.000,-		●					
	6. Opknappen vlonderpaden	€ 93.750,-		●					
	7. Uitbreiden oppervlakte hangvennen	€ 93.750,-		●					
	8. Natuurspeelplaats	€ 26.500,-		●					
	9. Vijverranden opwaarderen	€ 511.250,-							●
	10. Aanplant bomenlaan	€ 74.375,-						●	
	11. Vernieuwen bestaande verlichting & aanbrengen verlichting verlengde Van Galenstraat	€ 187.500,-			●				
	12. Revitaliseren asfaltpaden in het park	€ 700.000,-					●		
	13. Verbijzonderen hoofdentree (P2)	€ 62.500,-				●			
	14. Zitvoorzieningen en afvalbakken vernieuwen in park	€ 193.750,-			●				
	15. Opwaarderen parkeerplaats Schuttershüske (P1) en gedeelte entreeweg	€ 900.000,-			■				
	16. Opwaarderen parkeerplaats roeivijver (P2)	€ 1.050.000,-			■				
	17. Vervangen kunstwerk bij P2	€ 500.000,-							●
	18. Libellenpad	€ 93.750,-				●			
	19. Realisatie hondenspeelweide	€ 250.000,-						●	
Subtotaal		€ 4.910.875,-		€ 339.000,-	€ 1.356.250,-	€ 1.131.250,-	€ 748.750,-	€ 324.375,-	€ 1.011.250,-
Wensen	20. Bloemen(pluk)veld	€ 37.500,-							
	21. Verplaatsen parkeerplaats Kleiberg (P3)	€ 650.600,-							
	22. Verbijzonderen hoofdentree P3	€ 110.650,-							
	23. Scheiding wandel-en fietspaden	€ 242.000,-							
	24. Bijzonder middelpunt - aanleg steiger / brug	€ 836.250,-							
	25. Conservering waterwinning	NTB							
	26. Herstellen zichtlijn Kleiberg - kinderboerderij	NTB							
Subtotaal		€ 1.877.000,-							
Totaal projectkosten		€ 6.787.875,-							

Tabel 1. Uitvoeringsprogramma 2025-2033

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Kosten conform raming gemeente Brunssum d.d. 2 juli 2025

¹ Prijspeil 2025. Rekening dient gehouden te worden met een prijsindexering conform de richtlijnen uit de ciculaire.





BIJLAGE 1

Op de volgende pagina's worden de maatregelen van het uitvoeringsprogramma nader belicht, waarbij onderscheid wordt gemaakt in fasering, kosten^{1,2,3} en initiatiefnemer. Een korte toelichting en locatie per onderdeel volgt daarbij.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

¹ Prijspeil 2025. Rekening dient gehouden te worden met een prijsindexering conform de richtlijnen uit de ciculaire.

² Ontwerp & engineering, circa 15% van uitvoeringskosten. Inclusief uitvoeringsbegeleiding, onderzoeken.

³ Apparaatkosten overheid, vergunningen, procedures en communicatie, circa 10% van uitvoeringskosten.



1. Realisatie Schutterspromenade

Fase: Uitgevoerd

Totale projectkosten: -

Uitvoering: Gemeente Brunssum

De belangrijkste recreatieve structuur uit de ontwerpen van Van Nes en Bergmans is hersteld en definitief uitgebouwd tot de centrale verbindende as van het Volkspark. De entreepoort is hierbij richting het Schuttershüske verschoven. Langs deze promenade zijn verschillende langgerekte zitelementen gepositioneerd en is het station van de Stoomgroep in het ontwerp geïntegreerd. Aanplant van rododendrons zorgt voor een groene inpassing in de omgeving.



2a & 2b. Herinrichten voorterrein Schuttershüske

Fase: 2028

Totale projectkosten: € 48.750,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Op het kruispunt tussen de promenade en de landweer is het terras van het Schuttershüske opnieuw ingericht, zodat het centrale entreeplein van het Schutterspark haar allure deels terug heeft gekregen.

Het terras van het Schutterhüske is reeds heraangelegd, evenals de entree naar de Schutterspark promenade. Dit project betreft uitsluitend de reconstructie van de trappartij die de toegangsweg met het terras van het Schuttershüske verbindt.





3. Opstellen beeldkwaliteitplan

Fase: Uitgevoerd

Totale projectkosten: € 15.000,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Om de samenhang in het park te waarborgen, dient een beeldkwaliteitplan te worden opgesteld, waarin materialisatie en ontwikkelrichtingen worden opgenomen.

In samenspraak met de verschillende ondernemers in en rondom het Schutterspark kan zo tot een gedragen BKP gekomen worden. Aan de hand van dat document kunnen ontwikkelingen worden getoetst en vormgegeven, zodat deze ook passen binnen het gewenste eindbeeld.



4. Renoveren trap Kleiberg / trap integreren in routing

Fase: Uitgevoerd

Totale projectkosten: -

Uitvoering: Gemeente Brunssum

De trap op de Kleiberg heeft reeds een opwaardering gekregen. Aan boven- en onderzijde van de trap wordt deze op representatieve wijze geïntegreerd in de routing en padenstructuur van het park en verbonden met de entree.





IN VOORBEREIDING

5. Vernieuwen bebording en bewegwijzering

Fase: 2025
Totale projectkosten: € 125.000,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Bebording en routing in het park zijn sterk verouderd, niet compleet en sluiten bovendien niet meer aan op de landelijke richtlijnen, waardoor een rommelig beeld ontstaat. Nieuwe bebording is daarom noodzakelijk.



IN UITVOERING

6. Opknappen vlonderpaden

Fase: 2025
Totale projectkosten: € 93.750,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Vlonderpaden in het noordelijke deel van het Schutterspark vormen een van de pijlers onder het recreatieve netwerk in het *natuurdeel* van het Schutterspark. Door deze vlonders op te knappen wordt de levensduur voor langere tijd verlengd en blijft ook deze unieke natuur voor recreanten ontsloten en beleefbaar.





IN UITVOERING

7. Uitbreiden oppervlakte hangvennen

Fase: 2025
Totale projectkosten: € 93.750,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Uitbreiden oppervlakte hangvennen door in te grijpen in de opstand Amerikaanse eiken en naalddhout, zodat populaties bijzondere flora en fauna zich kunnen uitbreiden en hier voor deze soorten ook een robuuste stapsteen kan ontstaan tussen de Brunssummerheide en de Schinveldse bossen. Deze ingreep geeft de natuur in dit gebied een aanzienlijke impuls en verhoogt de unieke ecologische waarde.



UITGEVOERD

8. Natuurspeelplaats

Fase: Uitgevoerd
Totale projectkosten: € 26.500,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Een natuurspeelplaats in het Schutterspark biedt ruimte voor kinderen om te spelen, niet op traditionele speeltoestellen maar gebruik makend van natuurlijke speelaanleidingen zoals boomstammen of grote rotsblokken, stenen etc.





9. Vijverranden opwaarderen

Fase: 2030
Totale projectkosten: € 511.250,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

De oevers van de vijvers van het Schutterspark dienen verstevigd en vernieuwd te worden, om te voorkomen dat oevers afkalven en hierdoor instabiel worden. De nieuwe oeverbeschoeiing van de grote vijver bestaat uit een nieuw frame van palen die in de bodem worden bevestigd, waartegen een houten kantplant met afdekking wordt bevestigd. Aan de achterzijde wordt de oever na afloop van de werkzaamheden verder aangevuld.

Vóór uitvoering van de werkzaamheden dienen onderzoeken naar water- en bodemkwaliteit te worden uitgevoerd, evenals verdere voorbereidende werkzaamheden op bijvoorbeeld het gebied van ecologie.



10. Aanplant bomenlaan

Fase: 2029
Totale projectkosten: € 74.375,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Langs kinderboerderij nieuwe aanplant bomen. De nieuwe aanplant zorgt dat alhier een duidelijke hiërarchie in de padenstructuur ontstaat en het bomendak weer gesloten wordt. Om ruimte te maken voor de bomen dient het pad versmald te worden.

Bomen hebben bij aanplant een grote maat, boomplantgat verbetering wordt toegepast om te zorgen voor ideale groeiplaatsomstandigheden voor de nieuwe aanplant.






11. Vernieuwen bestaande verlichting & aanbrengen verlichting verlengde Van Galenstraat

Fase: 2026
Totale projectkosten: € 187.500,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Verlichting conform de in het BKP Schutterspark vastgestelde type wordt aangebracht langs de verlengde Van Galenstraat in de richting van het Schutterspark, om sociale veiligheid te vergroten. Daarnaast worden alle bestaande masten en armaturen in het park vervangen.

Verlichting in het park dient vleermuisvriendelijk te zijn, dus mag uitsluitend omlaag schijnen richting pad (zie BKP Schutterspark). Aanleg verlichting en vervangen verlichting in het park kan vergunningsvrij.

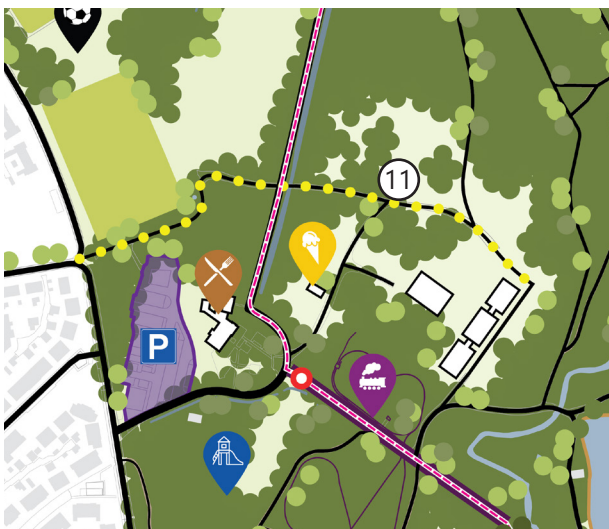

12. Revitaliseren asfaltpaden in het park

Fase: 2028
Totale projectkosten: € 700.000,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Reconstrueren asfaltverharding paden in het park. De kwaliteit van het asfalt is op dit moment matig, waardoor het raadzaam is de verharding te vernieuwen. Uitgangspunt is om qua kleurstelling en structuur aan te sluiten op de nieuwe verharding die is toegepast in de Schuttersparkpromenade. Op paden markeringen aanbrengen en bij ingangen park verkeersborden plaatsen om voetgangers en fietsers op elkaar te attenderen en elkaar ruimte te geven t.b.v. verkeersveiligheid.





13. Verbijzonderen hoofdentree parkeerplaats roeivijver (P2)

Fase: 2027
Totale projectkosten: € 62.500,-


Uitvoering: Gemeente Brunssum

De hoofdentree tot het Schutterspark nabij de parkeerplaats aan de roeivijver (P2) wordt gereconstrueerd, waarbij de architectonische verschijningsvorm overeenkomt met de entree en poort aan de Schutterspromenade.

De poorten krijgen een nieuwe coating en in een grijze kleurstelling en de aanliggende hekwerken worden uitgevoerd in spijlenhekwerken in dezelfde kleur.

Aan beide zijden van de poort worden pilaren gemetseld. De bestrating rondom de poort uitvoeren in straatbaksteen conform materialen beschreven in het Beeldkwaliteitplan Schutterspark.

Entree verfraaien met aanplant vaste planten en aansluiten op ontwerp P2.

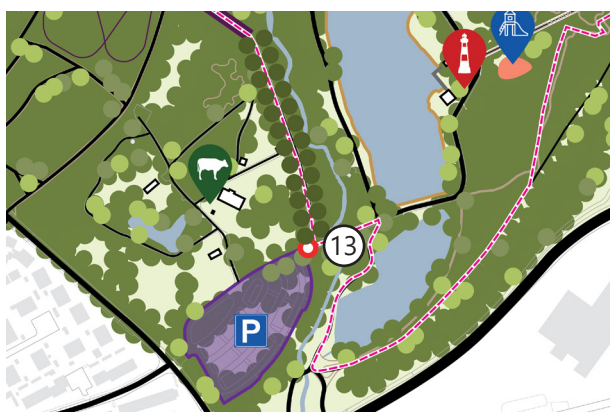

14. Zitvoorzieningen en afvalbakken in het park

Fase: 2026
Totale projectkosten: € 193.750,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Zitgelegenheden in het park zijn aan vernieuwing toe. Bij de plaatsing van nieuwe zitelementen is het van belang dat in het gehele parkdeel dezelfde zitelementen worden toegepast, conform het Beeldkwaliteitplan.

Dit project voorziet in de plaatsing van **30 nieuwe zitbanken** uit dezelfde lijn zoals de banken die aan de Schutterspromenade zijn geplaatst.

Daarnaast worden ook **10 nieuwe afvalbakken** geplaatst als vervanging van de huidige afvalbakken.



15. Opwaarderen parkeerplaats Schuttershüske (P1)

Fase: 2026-2027

Totale projectkosten: € 900.000,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Om de totale beleving van bezoekers aan het Schutterspark te verbeteren worden parkeerplaatsen gereconstrueerd, zodat deze in architectuur aan zullen sluiten op de verdere opwaardering van het gehele park. Hierbij is aandacht voor groen, hemelwateropvang en -afvoer en verdere maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie. De parkeerplaatsen uitvoeren in grasbetontegels met een bomendak om een groene uitstraling aan het terrein te geven.



16. Opwaarderen parkeerplaats roeivijver (P2)

Fase: 2026-2027

Totale projectkosten: € 1.050.000,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

De parkeerplaats naast de roeivijver en de kinderboerderij krijgt eveneens een opwaardering. Uitgangspunt is om de verschillende parkeerplaatsen rondom het Schutterspark in dezelfde architectonische verschijningsvorm uit te voeren, waarbij aandacht is voor groen en klimaatadaptatie.





17. Vervangen kunstwerk bij parkeerplaats roeivijver (P2)

Fase: 2030
Totale projectkosten: € 500.000,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

De brug over de Rode beek in het pad bij de parkeerplaats nabij de roeivijver (P2) dient vervangen te worden voor een nieuw exemplaar.



18. Libellenpad Schutterspark

Fase: 2027
Totale projectkosten: € 93.750,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Opwaarderen Libellenpad (een wandelroute door het park, voorheen Parelpad): herstellen informatieborden, vervangen parels door libellen, plaatsen extra bord, actualiseren informatieborden, digitaal opwaarderen via Visit Zuid-Limburg, verwijderen routepalen, aanbrengen overall informatiebord met complete route.



Referentiebeeld




19. Realisatie hondenspeelweide

Fase: 2029
Totale projectkosten: € 250.000,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Vanwege het ontbreken van plekken met voorzieningen voor honden is het voorstel om een hondenspeelplek in te gaan richten. Honden kunnen hier naar hartenlust spelen in een ruim opgezette speelzone, die volop plek biedt voor honden en mensen om veilig te rennen, spelen en socialiseren. Aanwezig zijn natuurlijke speelelementen, zitplekken voor hondeneigenaren en een watervoorziening voor de dieren. De weide zou bijvoorbeeld ingericht kunnen worden op de locatie waar nu de speeltuin is, deze kan mogelijk verplaatst naar het evenemententerrein. De exacte locatie zal nader onderzocht moeten worden.



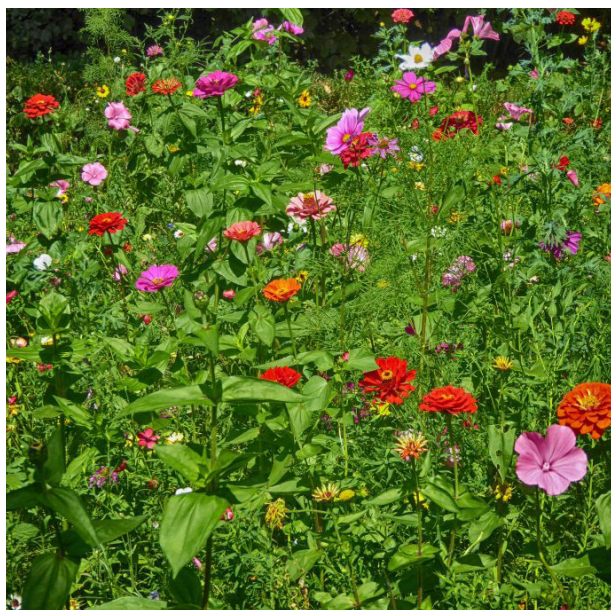

20. Bloemen(pluk)veld

Fase: n.t.b.
Totale projectkosten: € 37.500,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Inzaaien van een bloemenveld heeft niet alleen esthetische waarden voor het Schutterspark, het biedt gebruikers en bezoekers ook de mogelijkheid tot het plukken van deze bloemen. Onderzocht wordt of het inzaaien van een bloemen- en kruidenrijk grasland met inheemse, gebiedseigen soorten ingepast kan worden binnen de natuurbestemming van het Schutterspark.

Het bloemenplukveld is gesitueerd naast de picknickweide, aan de voet van de voormalige skipiste.



21. Verplaatsen parkeerplaats Kleiberg (P3)

Fase: n.t.b.
Totale projectkosten: € 650.600,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

De parkeerplaats aan de Kleiberg, nabij de ingang tot het BloteVoetenPark, kan verplaatst worden naar de overzijde van de Ganzepool. Hierdoor worden de randen van het park op deze locatie niet ontsierd door een grote hoeveelheid geparkeerd blik.

Het eventueel verplaatsen van de parkeerplaats dient in nauw overleg met eigenaren van de ondernemingen op de Kleiberg uitgevoerd te worden, gezien de grote importantie van deze voorziening voor de betreffende ondernemingen.






22. Verbijzonderen hoofdentree parkeerplaats Kleiberg (P3)

Fase: n.t.b.
Totale projectkosten: € 110.650,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

De entree tot het Schutterspark nabij de parkeerplaats op de Kleiberg is momenteel niet gemarkeerd met een poort of andere duidelijke afbakening. Om eenheid in de entrees van het park te brengen, kan op termijn ook hier de poort vergelijkbaar met de poort in de Schutterspromenade worden aangebracht.

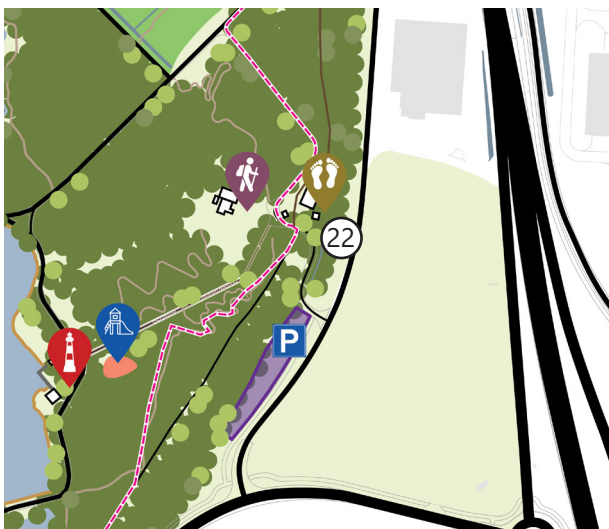

23. Scheiding fiets- en wandelpaden

Fase: n.t.b.
Totale projectkosten: € 242.000,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Scheiden van fiets en wandelpaden om de veiligheid van de verschillende verkeersdeelnemers te verbeteren. Deze maatregel betreft het aanleggen van een aparte, eenvoudige, vrijliggende wandelstrook en de daarbijbehorende aanduidingsborden en voorzieningen.




24. Inrichten bijzonder middelpunt van het Schutterspark aan de roeivijver

Fase: n.t.b.
Totale projectkosten: € 836.250,-

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Het ontwikkelen van een centraal trefpunt in het Schutterspark dient om een plek te creëren van waaruit alle recreatieve voorzieningen op overzichtelijke wijze bereikbaar zijn. Samen met het terras aan het Schuttershüske vormt deze plek het uiteinde van de as die de promenade vormt en neemt daarmee een belangrijke functie in. Sluit aan op reconstructie van de Schutterspromenade. Onderdeel van deze maatregel is ook de brug over de Rode beek.

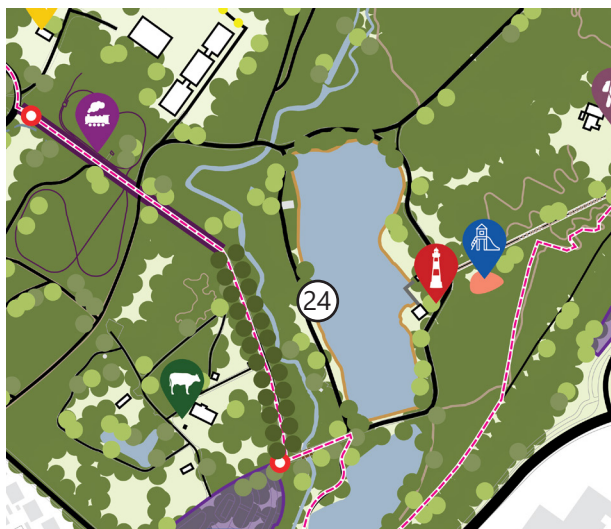

25. Conserveren waterwinputten

Fase: n.t.b.
Totale projectkosten: n.t.b.

Uitvoering: Gemeente Brunssum

Conserveren waterwinputten, uitvoeren beheer in zichtlijn van de waterleiding en toevoegen van puttenveld en pomphuizen met inbegrip van het thema waterwinning aan beschermd dorpsgezicht. Vanwege specifieke karakter en afhankelijkheid van derden is deze maatregel niet concreet te plannen.





26. Herstellen zichtlijn via de trap op de Kleiberg

Fase: *n.t.b.*

Totaal kosten: *n.t.b.*

Uitvoering: *Locale ondernemer*

Herstellen zichtlijn via de trap op de Kleiberg over het terrein van de mini-haven tot op de kinderboerderij aan de overzijde van de roeivijver. In het verleden heeft op deze locatie de flightline / kabelbaan gestaan.

Een particulier initiatief om deze te herstellen is er momenteel niet, maar kan in de toekomst eventueel worden gestart.





Schutterspark, Brunssum
Uitvoeringsprogramma 2025-2030



14 oktober 2025

bureau **VERBEEK**
landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp

bureau VERBEEK
landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp
Limmelderweg 6
6222 PB Maastricht
T : +31 43 450 30 45
E : info@bureauverbeek.nl
I : www.bureauverbeek.nl
